
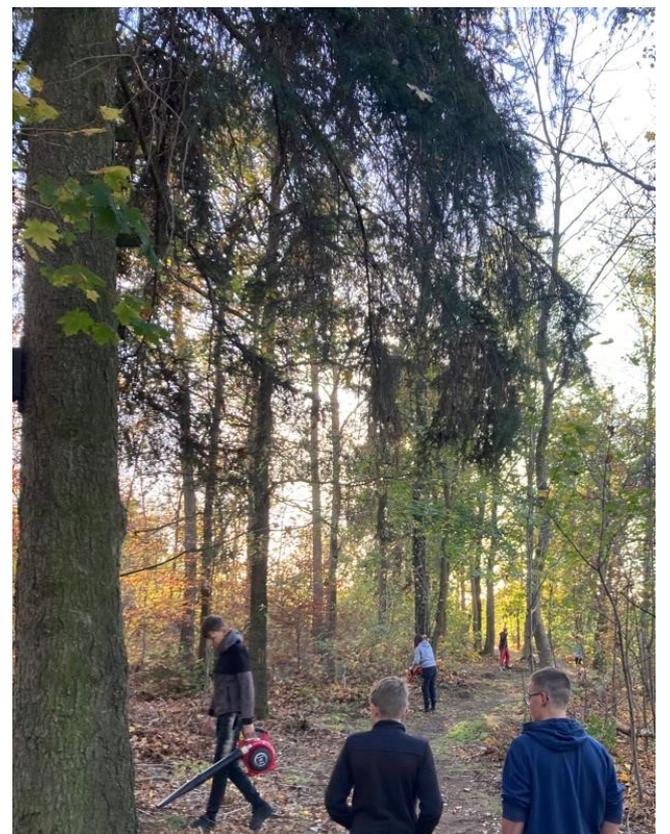


02.11.2022 + 03.11.2022

Am 02.11.2022 und am 03.11.2022 fanden die ersten beiden ersten kleinen Arbeitseinsatz auf dem Gelände, wo der neue Bikepark in Zschorlau entstehen soll statt. Gemeinsam wurden Ideen gesammelt, wie man den Bikepark in Zschorlau (z.B. Streckenverläufe) umsetzen könnte. Ziel war es, dass Gelände in den beiden Tagen auf Vordermann zu bringen und für den Bau des Rückwegs und somit der ersten Rampen vorzubereiten. Dazu wurde das Gelände u. A. von Laub, Ästen und Zweigen befreit.

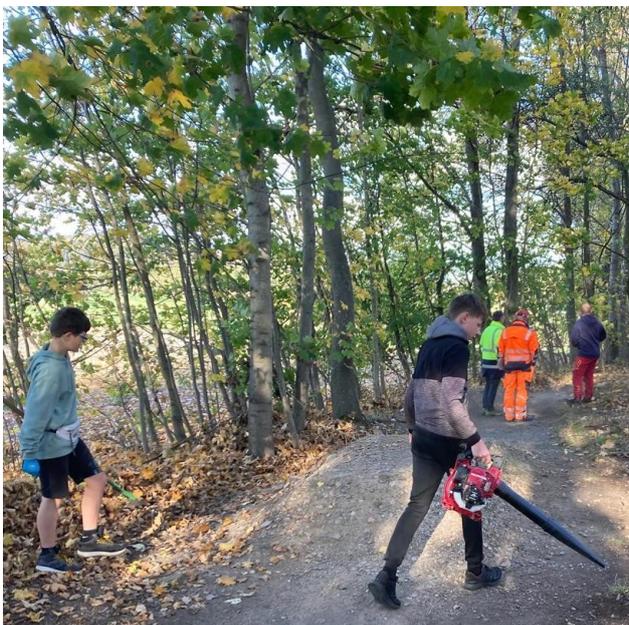

07.11.2022 + 08.11.2022

Am 07.11.2022 und am 08.11.2022 haben wir die Zufahrt für die neue Strecke gebaut und den Weg angerichtet. Dafür haben wir Teerabrieb von der Gemeinde Zschorlau bekommen. Mit Schaufeln, Schubkarren und Rüttelplatte wurde der Weg angerichtet und besser fahrbar gemacht. Auch die Anwohner haben sich über die Bauaktion gefreut und sogar mit angepackt.



11.11.2022 – 13.11.2022

Am Wochenende vom 11.11.2022 bis zum 13.11.2022 ging es endlich los. Für das Wochenende stand uns ein Radlader zur Verfügung. Mit dem haben wir ca. 80 m³ Erdmassen bewegt und die Rampen für den Rückweg gebaut.



01.12.2022

Am 01.12.2022 ging es dann etwas ruhiger zu. Wir haben noch ein wenig Streckenpflege betrieben und das Gelände „winterfest“ gemacht. Im Jahr 2022 sollte kein Baueinsatz mehr stattfinden. Danach haben wir eine kleine Weihnachtsfeier gemacht, gegrillt und die Strecke ausgeleuchtet, damit die ersten Runden gedreht werden können. Im nächsten Jahr geht es dann mit den großen Rampen weiter.



24.05.2023

Am 24.05.2023 ging es mit einem Arbeitseinsatz im neuen Bikepark weiter. Wir haben die Strecke gepflegt und das Gelände für den Bau des Hauptparks vorbereitet. Danach wurde noch gemeinsam der Grill angeworfen und die Pläne für den Bau des Hauptparks verfeinert.




09.09.2023 + 10.09.2023

Am 09.09.2023 und 10.09.2023 stand uns erneut der Radlader zur Verfügung. Die beiden Tage wurde genutzt, um die Startrampe für den Hauptpark zu bauen. Dafür brauchen wir viel Erde, haben auch viel an den beiden Tagen geschafft.



29.09.2023

Mit einem Bagger konnten wir die Startrampe am 29.09.2023 fertig stellen.

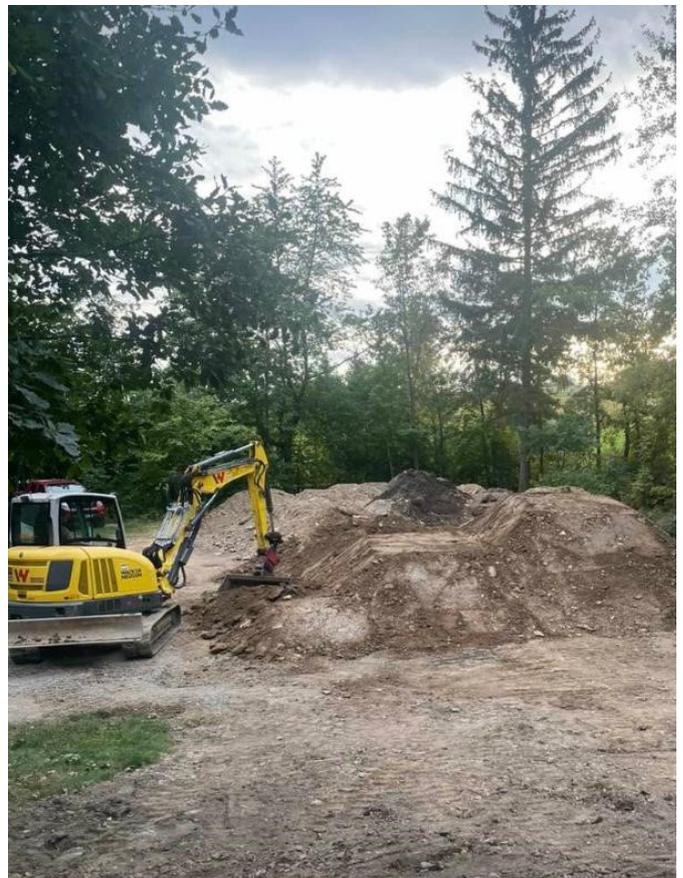

30.09.2023 – 02.10.2023

Vom 30.09.2023 bis zum 02.10.2023 ging es an den Bau des Hauptparks. Uns stand ein Bagger und die Hilfe von ganz vielen Leuten zur Verfügung. Jugendliche, Eltern, Nachbarn, Freiwillige.. Alle packten mit an, um den neuen Bikepark in Zschorlau zu bauen. Am Samstag wurde gemeinsam gegrillt. Entstanden sind mehrere Rampen mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Angefangen mit kleinen Hügeln und der Kidslane, bis hin zu den großen Rampen für erfahrenen Radfahrer.





09.10.2023

Am 09.10.2023 wurde in Regen und Matsch der Container als Lagermöglichkeit für Baugeräte zur Streckenpflege geliefert und aufgestellt.

